


橋処理センター建設工事 週間工程表

三菱・大成建設共同企業体

2020年10月10日

	10月						
	12	13	14	15	16	17	18
	月	火	水	木	金	土	日
地下構造物解体撤去工事	ごみ焼却処理棟 杭抜き工事(注1)						
建設工事	資源化処理棟 埋戻し工事						
	資源化処理棟 鉄筋・型枠工事						
				資源化処理棟 コンクリート打設(注1)			
	ごみ焼却処理棟 鉄筋・型枠工事						
	ごみ焼却処理棟 コンクリート打設(注1)					ごみ焼却処理棟 コンクリート打設(注1)	
					ごみ焼却処理棟 型枠解体工事		
	ごみ焼却処理棟 山留工事(注1)						
	煙突 杭工事(注1)						

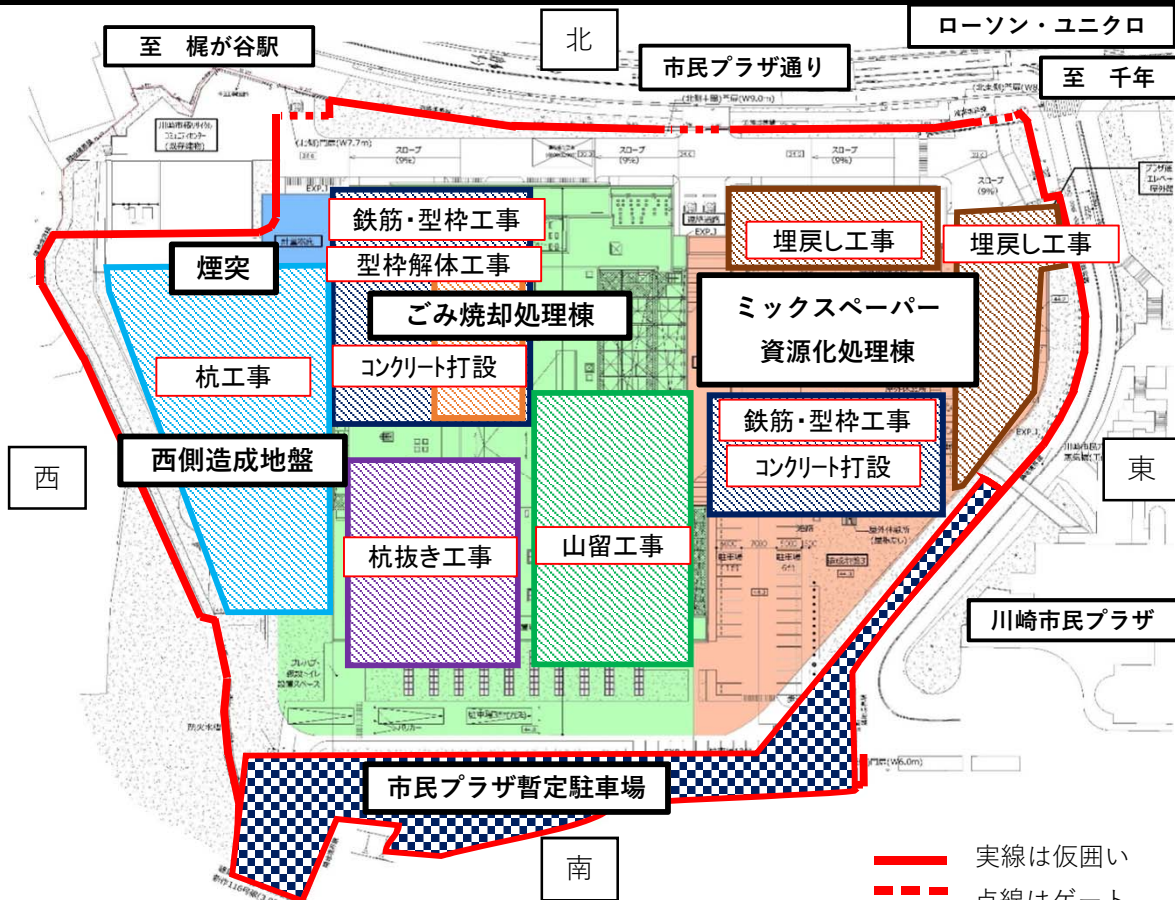

※天候や工事の進捗により、工程が前後する場合があります。
 (注1) 杭工事・杭抜き工事・山留工事・コンクリート打設工事等は安全上・品質上の都合により、12:00からの休憩時間に作業を行う場合があります。
 又、コンクリートを打設した日には時間外作業及び照明の点灯を行うことがあります。作業の内容はコンクリートの表面を平らに仕上げるための左官工事なので騒音、振動は発生しません。
